

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

Zápis z KD č. 27

Akce:	Kontrolní den - „Chožov“	Datum:	26. 5. 2015
Místo stavby:	Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno	Čas:	8 00
Příští KD	8. 6. 2015	Čas:	8 00 hod.

Účastníci viz jmenný seznam na konci zápisu

## I. STAV ROZPRACOVANOSTI ČINNOSTI a ÚKOLY

Kd/č./poř.	Činnost - úkol	Termín	Zodpovídá
<b>ČOV</b>			
	-Stavebně dokončeno, pokračuje MT technologie - dokončena ČOV-připravena pro zkušební provoz - dokončeny HTU - realizují se zpevněné plochy a komunikace - dokončen výústní objekt		zhotovitel
<b>Kanalizace CHOŽOV</b>			
4.1.CH.2	- stoky tlakové kanalizace dokončeny , stavební části odkalovacích a odvzdušňovacích šachet dokončeny Plán na další období: OKALY se budou připojovat po uvedení ČOV do provozu – tzn. 05/15- <a href="#">plán-od 15.5.'15</a> Probíhá vystrojování šachet na výtl. řadech (vzdušníky + kalníky) technologií. - <a href="#">probíhá</a>	trvá	zhotovitel
5.1.CH.3	EL. pro čerpací stanice – provedeny přípojné body ČS, zbývá realizovat vlastní přípojky elektro. Třtěno + Mnichovský Týnec-změna charakteristiky jističů. Def. přípojka pro ČS bude provizorně použita pro staveništní rozvaděč. Připraveny pilíře s měřením-osazeny elektrohodiny. Staveništní odběr hradí zhotovitel do předání.	trvá T: 05/15	Zhotovitel/Investor
25.1 CH 1	Realizace definitivních úprav a obnovy povrchů komunikací ve správě SUS bude zahájena od 11.5.'15. Následně budou prováděny také opravy povrchů místních komunikací <a href="#">Chožov:- Dokončeno odfrézování pův. krytů vozovek, provádí se dobourávání živice a dokončují se lokální vysprávký podkladních vrstev.</a> <a href="#">Pokládka nového živičného krytu bude probíhat od 27.5.'15</a> <a href="#">Zhotovitel upozorňuje na místa, kde v komunikaci ve správě SUS nejsou dostatečné konstrukční vrstvy. (Jedná se o trasu vodovodu, od č.p. 101 k č.p.114).</a> - Zhotovitel vyvolá místní šetření za účasti SÚS		Zhotovitel
27.1.CH 1	Probíhá přepojování jednotlivých nemovitostí na kanalizaci - Chožov		
<b>Kanalizace Mnichovský Týnec</b>			
7.1.M.1	Stoky dokončeny, bez překopů SÚS.		Zhotovitel

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

	<p>Plán na další období: Práce v silnicích ve správě SUS byly zahájeny dne 11.5.'15 (odfrézování stáv. živičného krytu komunikace)</p> <p>Po projednání změny stavby před dokončením bude realizována stoka B.5. (29.5. vypsáno MŠ a násl. bude vydána změna SP)</p>	Trvá-nástup NT.1.6.'15	
14.1.M.2	<p>-na základě nové skutečnosti – odsouhlasení změny trasy přes pozemek st.p.15 pana Vlastimila Podpěry (jmenovaný při projednávání projektu nesouhlasil s pokládkou kanalizace přes jeho pozemek), dochází ke zkrácení trasy tlakové kanalizace o cca 153 m a zrušení jedné čerpací stanice(ČS2). Úsek tlakové kanalizace je na trase B5 a B5.1 do ČS1.</p> <p>Vydáno územní rozhodnutí, které již je v právní moci. Investor následně požádal o vydání stavebního povolení.</p> <p>Na tuto úpravu byl zpracován změnový list ZL3. Po dodání RPD bude tento ZL-3 aktualizován a předložen k odsouhlasení</p> <p>Příslušná šachetní dna zhotovitel objedná po schválení tohoto ZL</p>	Trvá	
<b>Tlaková kanalizace</b>			
12.1.TL.1	<p>Tlaková kanalizace Třtěníno – Mnichovský Týnec– položeno vše, vč. přechodu vodoteče (cca 30m), provedena kpl stavební část armaturních šachet.</p> <p>Dokončuje se vystrojování armaturních šachet výtlačků.</p> <p>Realizace stavební části ČS je plánována do 10.6.'15.</p> <p>Provedení vystrojování ČS technologií – do 30.6.'15</p>	Trvá	Zhotovitel
<b>Kanalizace TŘTĚNO</b>			
	<p>- pokračují práce na stokách ve Třtěníně.</p> <p>-vzhledem ke spodní vodě bude provedena záměna podsypového materiálu na makadam 8-16.(Změnový list č. 4)-po dokončení prací bude aktualizovaný nezbytný rozsah této úpravy</p> <p>Realizuje se stoka C – hlavní silnice. – dokončeno po Š 183 - k. dnešku</p> <p>Termín dokončení stoky C v komunikaci SUS – do 24.6.'15</p>	Provádí se	
<b>ČOV</b>			
26.1.1.	<p>ČOV – příprava na zahájení zkušebního provozu</p> <p>TDI žádá zhotovitele o předání veškeré dokladové části potřebné pro zkušební provoz ČOV – ta bude předána vodohospodářskému orgánu při místním šetření na zahájení zkušebního provozu</p>		
25.1.1	<p>Komplexní zkoušky instalované technologie – zahájeny, dále probíhá napouštění nádrží.</p> <p>Následně bude po doložení kompletní dokladové části svoláno místní šetření pro povolení zkušebního provozu</p>		Zhotovitel
<b>Společné</b>	<p><b>Projektant, spolu se zhotovitelem, dnes v rámci KD předává zpracovaný Provozní řád pro zkušební</b></p>		Zhotovitel/projektant

# Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěníno - ČOV a kanalizace

	<b>provoz</b>		
25.1.2	Zhotovitel informuje, že v obci Chožov se lze na vybudovanou kanalizaci napojovat již od 1.5.'15	<b>T: 1.5.'15</b>	
25.1.3	<b>Proškolení obsluhy proběhlo dne 14.5.'15 – viz. protokol o proškolení obsluhy ČOV</b>		Zhotovitel

## II. SLEDOVÁNÍ HMG

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
7.2.5.	- <b>ČOV</b> – dle vydaného upraveného HMG práce probíhají dle aktualizovaného HMG. - <b>Mnichovský Týnec</b> – Zahájení prací na stavbě kanalizace v komunikaci ve správě SÚS - <b>Třtěníno</b> – práce nadále probíhají dle HMG výstavby	Průběžná kontrola	Zhotovitel

## III. FAKTURACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## IV. SLEDOVÁNÍ KVALITY

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
		průběžně	zhotovitel

## V. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá

## VIII. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
18.8.1	Projektant zpracovává RPD - elektročást k čerpacím stanicím	<b>NT 16.3.'15 trvá</b>	projektant

## IX. SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

	Činnost – úkol	Č. změnového.l.	úsek
2.7.1	změna trasy stoky B5 v Mnichovském Týnci – předáno ke kontrole	ZL 3	Trasa B5
21.7.2	Inž. síť Chožov předána ke kontrole Administrátor dotace předá na SFŽP	ZL 2	

## Chožov, Mnichovský Týnec, Třtěno - ČOV a kanalizace

21.7.3	ČOV Administrátor dotace předá na SFŽP	-předáno ke kontrole	ZL 1	
21.7.4	Třtěno -drenážní vrstvy TDI. Bude upraveno na zákl skut provedených prací	zpracován návrh ZL, projednává se s obj. + -	ZL 4	






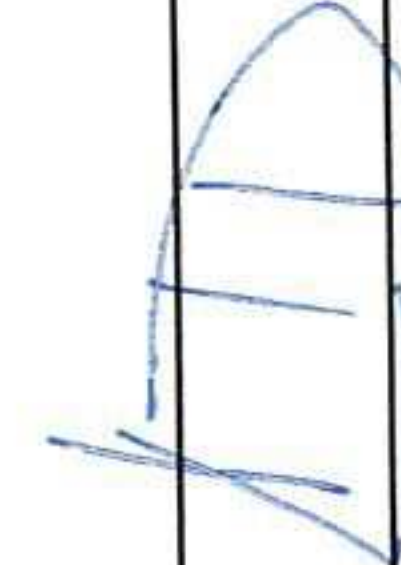
### X. BOZP

Č.ú.	Činnost – úkol	Termín	Zodpovídá
2.8.1	Z hlediska BOZP –	I nadále bez připomínek	zhotovitel

### Zapsal

Jméno a příjmení:	Ing.Tomáš Melichar	Telefon	602 236 001
-------------------	--------------------	---------	-------------

Prezenční listina – 25. 5. 2015

Firma	Jméno	Telefon	Mobil	E-mail	Podpis
Obec Chožov	Miroslava Otoupalová	415 674 117	724 179 911	<a href="mailto:ouchozov@seznam.cz">ouchozov@seznam.cz</a>	
Obec Chožov	Erszébet Stránská		604 930 002	<a href="mailto:stranska@zscernice.cz">stranska@zscernice.cz</a>	
Obec Chožov	Jan Slavík				
PROVOD, s. r. o.	Ing. Jitka Malá	474 720 570	605 267 649	<a href="mailto:jitka.mala@provod.cz">jitka.mala@provod.cz</a>	
PROVOD, s. r. o.	Ing. Hana Čejková	474 720 565	739 658 795	<a href="mailto:hana.cejkova@provod.cz">hana.cejkova@provod.cz</a>	
technický dozor	Ing. Tomáš Melichar	286 856 037	602 236 001	<a href="mailto:tomasmelichar@volny.cz">tomasmelichar@volny.cz</a>	
SGS Czech Republic, s. r. o.	Petr Nápravník	234 708 111	603 209 409	<a href="mailto:p.npravnik@volny.cz">p.npravnik@volny.cz</a>	
1.SČV, a. s.	Robert Morávek	318 494 206	606 666 937	<a href="mailto:rmoravek@1scv.cz">rmoravek@1scv.cz</a>	
1.SČV, a. s.	Petr Jícha	318 494 245	724 208 115	<a href="mailto:pjicha@1scv.cz">pjicha@1scv.cz</a>	
1.SČV, a. s.	Petr Kúrka		737 124 266	<a href="mailto:Kurka.petr@seznam.cz">Kurka.petr@seznam.cz</a>	

PROVOD

ING. MIROSLAV  
JANÍČEK

737494237

miroslav.janicek@provod.cz

